


いでのたすのつくりかた [井出町の資源を醸成する町民参加のしくみ]

●各フェーズごとのWSを積み重ねて“いでのたす”完成後につなげる

フェーズ1：リサーチ フェーズ2：空間につなげる フェーズ3：試してみる 完成後

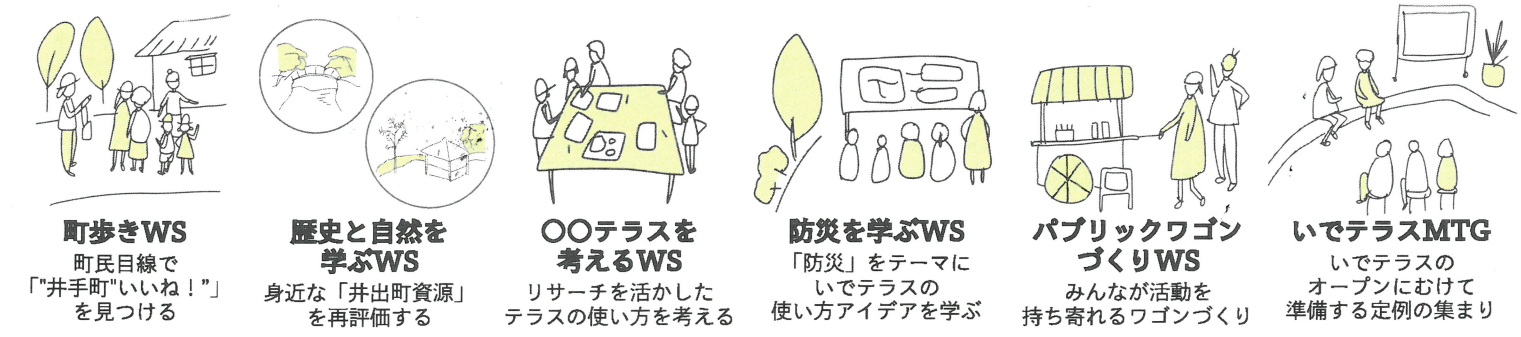

[取組みプロセス/コスト・工程管理の工夫]

●井手町の皆さんと共に考えてつくる“共有型プロセス”

庁舎をつくる“プロセス自体を体験型・参加型としてひらくこと”で、井手町の内外の人々を巻き込んだ地域が活性化する取組としていきます。日常時や災害時に備えた町内の使われ方を丁寧にヒアリングし、完成後の使われ方を具体的に想像し、設計中から実践することで、町民が新しい地域拠点としての“いでのたす”に直接関わる機会を創出します。また、WSなどのソフト面から、コストや工程などのリスクマネジメントも適切に実施します。

	'19年度			'20年度			'21年度			'22年度			'23年度		'24年度	
	5	7	9	11	1	3	5	7	9	11	1	3	5	7	9	11
井出町役場	与条件整理/精密配置/構造設計計画			各設備スペック決定			現場段階での詳細仕様確認			移転		庁舎供用開始				
設計	キックオフ	定期的な設計mtg	定期的な設計mtg	定期的な設計mtg	定期的な設計mtg	定期的な設計mtg	現場定例	現場定例	現場定例	現場定例	現場定例	現場定例	現場定例	現場定例	現場定例	
工事	概算	概算	概算	概算	概算	概算	工事期間	工事期間	工事期間	工事期間	工事期間	工事期間	工事期間	工事期間	工事期間	
井出町の人々・資源	各フェーズに合ったWSの実施	設計WS	設計WS	設計WS	設計WS	設計WS	設計WS	設計WS	設計WS	設計WS	設計WS	設計WS	設計WS	設計WS	設計WS	

[設計チームの特徴]


●対話力・行動力・技術力を兼ね備えたパートナー体制

多様な実績と柔軟な取組み意欲を持って、井手町の未来を共に考えるパートナー体制で業務を実施します。統括事務所は、意匠設計からまちづくりまで総合的な設計経験が豊富です。協力事務所には、高い専門技術力のある意匠・構造・環境設備・ランドスケープ・積算事務所を置きまちづくりと一体的な庁舎づくりを確実にサポートします。また、行政やまちづくり協議会、町民団体や拠点をはじめとする、井手町の多様なステークホルダーの方々と意見交換をしながら進める実施体制です。



いでのたすのつかいかた [井出町の交流拠点“いでのたす”の役割]

●井手町のヒト・コト・モノがつながる舞台としての“いでのたす”

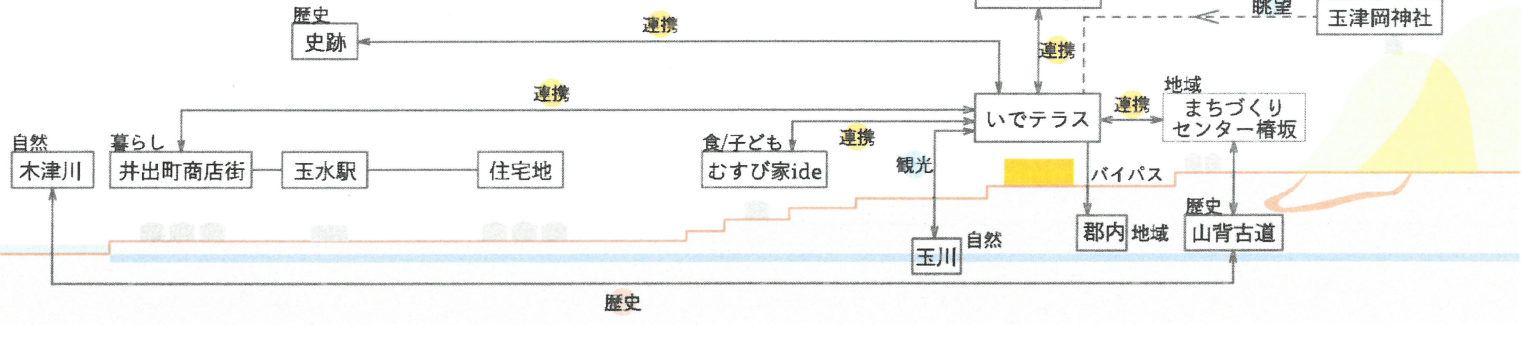

[“いでのたす”の可能性]

●“いでのたす”がきっかけで生まれる町民活動が発展し、みらいの井手町へとつながる交流活動へ

現在井手町で行われている行事との連携や、拠点施設との連携を積極的に実行します。まちづくりという長期的な視点を持ち、将来的には持続可能な交流活動へとつながることを想定して“いでのたす”を活用します。



●井手町のまちを見守り、未来をつくる“いでのたす”

